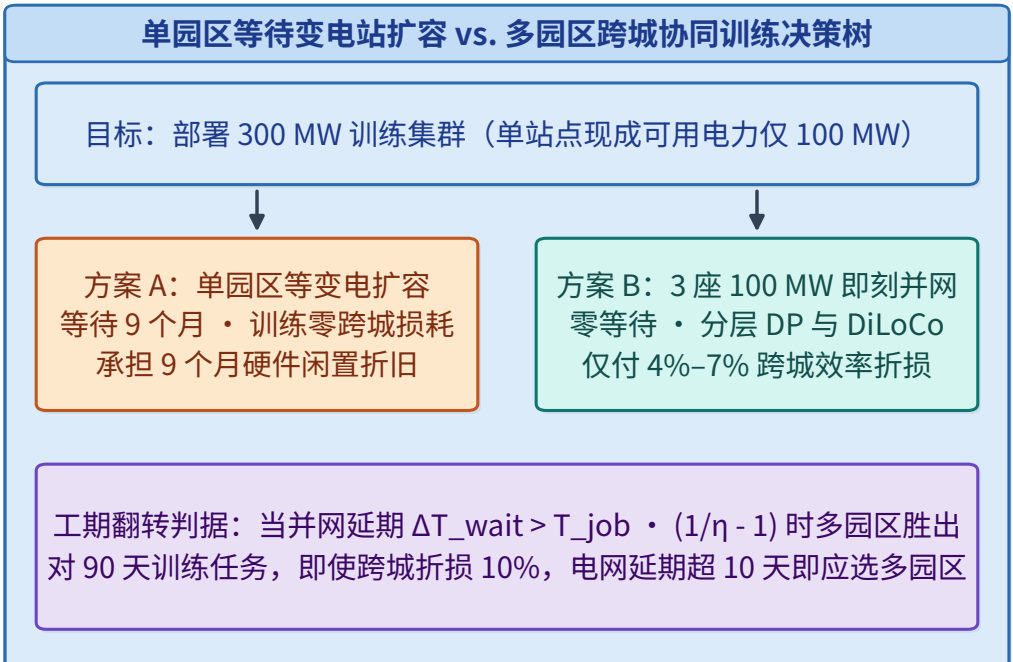
单园区等待变电站扩容 vs. 多园区跨城协同训练决策树
目标：部署 300 MW 训练集群（单站点现成可用电力仅 100 MW）
方案 A：单园区等变电扩容
等待 9 个月 · 训练零跨城损耗
承担 9 个月硬件闲置折旧
方案 B：3 座 100 MW 即刻并网
零等待 · 分层 DP 与 DiLoCo
仅付 4%–7% 跨城效率折损
工期翻转判据：当并网延期 ΔT_wait > T_job · (1/η - 1) 时多园区胜出
对 90 天训练任务，即使跨城折损 10%，电网延期超 10 天即应选多园区
